



拉布大林农牧场有限公司粪污环境整治项目绩效评价报告

实施单位：拉布大林农牧场有限公司粪污环境整治

委托单位：额尔古纳市财政局

评价机构：内蒙古数财管理咨询有限公司

2024年12月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
1. 项目背景	1
2. 主要内容及实施情况	1
3. 项目资金投入及使用情况	2
(二) 项目目标	2
二、绩效评价工作开展情况	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围	2
1. 绩效评价目的	2
2. 绩效评价对象	3
3. 绩效评价范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价依据、评价方法、 评价标准	4
1. 绩效评价原则	4
2. 绩效评价指标体系	5
3. 绩效评价依据	7
4. 绩效评价方法	8
5. 绩效评价标准	8
(三) 绩效评价工作过程	9
1. 前期准备	9

2. 组织实施	9
3. 汇总评价	10
4. 资料归档	11
三、综合评价情况及评价结论	11
四、绩效评价指标分析	12
(一) 项目决策情况	12
1.项目立项情况分析	13
2.项目绩效目标设定分析	13
3.资金投入分析	14
(二) 项目过程情况	14
1.资金管理情况分析	15
2. 项目组织实施情况分析	16
(三) 项目产出情况	18
1. 产出数量情况分析	19
2. 产出质量情况分析	20
3. 产出时效情况分析	20
4. 产出成本情况分析	21
(四) 项目效益情况	21
1. 项目社会效益分析	22
2. 项目生态效益分析	23
3. 项目可持续影响分析	24
4. 项目满意度分析	24

五、存在的问题及原因分析	25
(一) 农民工权益保障不到位	25
(二) 未按要求预付安全文明施工费	25
(三) 施工过程中未进行建材质量检测	25
(四) 项目实施进度推进缓慢	25
六、有关建议	26
(一) 完善农民工工资支付保障制度体系	26
(二) 完善进度计划管理	26
(三) 施工材料进场后及时组织检测	27
七、其他需要说明的问题	27
(一) 关于评价责任的说明	27
(二) 提示报告使用者注意事项的说明	28
八、附件	28

前 言

本次评价主要采用将预先设定绩效目标与实现的效果进行比较。评价过程中坚持了科学规范、系统相关、突出重点和简便高效的原则，做到了标准统一、资料可靠、信息真实。评价过程分为前期准备、组织实施和分析评价三个阶段，采取定量分析与定性分析相结合的方法。通过实地听取汇报、勘查、查阅档案资料、发放调查问卷等方式开展评价，依据财政部、自治区针对预算绩效评价有关规定，从决策、实施过程、产出和绩效等方面进行了全面的评价并形成此绩效评价报告。

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

依据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》(国办发〔2017〕48号),深入开展畜禽粪污资源化利用行动,加快推进畜牧业绿色发展,农业部制定了《畜禽粪污资源化利用行动方案(2017—2020年)》,方案指出:推进畜牧业发展和畜禽粪污治理,是贯彻新发展理念,建设美丽中国的必然要求。认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,切实做好畜禽粪污资源化利用工作。

拉布大林农牧场有限公司各牧场牲畜基本实现集中饲养,每年产生的牲畜粪污废弃物达到 8.55 万吨,由于没有适当处理设施,目前全部露天堆放,对环境造成巨大损坏,严重影响到人们的正常生产生活,急需建设综合处理设施,变废为宝,同时解决环境污染问题。

2. 主要内容及实施情况

建安工程:新建 MBR 膜污水处理一体化设备厂房 2 座共 120 平方米;新建雨污分离棚 2500 平方米,挤奶厅玻璃钢罐 2 个,尿液池玻璃钢罐 3 个,无害处理填埋井 5 个。

设备购置:购置安装 MBR 膜污水处理一体化设备 2 套,清粪车 3 台,清洗吸污车 2 台,生物质锅炉 5 台,生物质压

块机 1 台，铲车 2 台。

项目开工日期为 2021 年 10 月 29 日，完工日期为 2022 年 8 月 15 日。

3. 项目资金投入及使用情况

拉布大林农牧场有限公司粪污环境整治项目预算数为 500 万元，实际到位资金 388.96 万元，截至 2024 年 12 月底，执行数为 388.96 万元，预算执行率达到 100%。

(二) 项目目标

本工程旨在建设两座共 120 平方米的 MBR 膜污水处理一体化设备厂房，以及 2500 平方米的雨污分离棚，并安装相关玻璃钢罐和无害处理填埋井等设施。同时，购置并安装 MBR 膜污水处理设备、清粪车、清洗吸污车、生物质锅炉、生物质压块机及铲车等设备，以满足污水处理、废物处理及生产需求，全面提升环境保护和生产效率。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价，一方面通过查验资金管理和使用是否规范，财务信息是否合规、完整，实施条件是否合理有效，资金立项依据是否充分，资金管理及其实施是否科学合理，是否有资金监督管理机制，管理制度、财务制度是否健全适用等，

本次评价以提高拉布大林农牧场有限公司粪污环境整治项目的管理水平。另一方面根据项目的绩效评价指标体系，采用科学的评价方法，对资金目标完成情况进行科学验证，对项目的产出效果、效益、可持续影响和服务对象满意度调查等进行评价，分析是否达到预算目标。进一步总结经验和做法，提出资金存在的问题和合理化建议，为本部门、财政部门提供资金投资决策依据，为进一步明确项目资金使用方向提供参考。

通过本次绩效评价最终要实现加强拉布大林农牧场有限公司粪污环境整治项目的预算绩效管理，强化收入、支出责任，建立科学、合理的资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，突出项目实施效果。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价对象为拉布大林农牧场有限公司粪污环境整治项目。

3. 绩效评价范围

本次绩效评价范围为拉布大林农牧场有限公司粪污环境整治项目的执行情况，以及截止评价时点各类效益的体现情况。从立项决策、预算资金收入、投入及使用、资金管理、项目组织实施、项目管理制度建设、项目目标完成情况、资金产出及效果等进行综合性分析评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价依据、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次项目资金收入、支出的绩效评价严格执行财政部、自治区预算绩效评价的有关规定。按照规范的程序进行组织和实施绩效评价工作，对项目绩效进行客观、公正的反映。做到评价工作流程清晰顺畅，评价工作步骤科学合理，评价工作开展规范科学。采用定量与定性分析相结合的方法对评价对象和内容进行分析评价。

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关、公开透明等原则，按照从决策到过程、产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合拉布大林农牧场有限公司粪污环境整治项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验资金收入、支出的效果。从决策、项目管理和绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，提出合理化的参考意见。以切实提升对拉布大林农牧场有限公司粪污环境整治项目管理的科学化、规范化和精细化水平。

本次绩效评价工作主要从以下几个原则出发：

- （1）客观公正、标准统一、资料可靠和公开透明；
- （2）严格执行规定的评价程序，采用定量为主定性为辅的综合分析方法，科学合理地对收入、支出的经济性、效

率性和效益性进行评价；

(3) 针对项目具体收入、支出及产出绩效进行评价，评价结果清晰反映项目收入、支出和产出绩效之间的对应关系，做到绩效相关；

(4) 绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

(1) 绩效评价指标的确定

本次评价指标体系根据财政部、自治区对预算绩效评价有关的规定，以及拉布大林农牧场有限公司粪污环境整治项目建设具体属性的基础上制定的。与评价对象密切相关，全面反映决策、项目的收入、支出管理、产出和效益。评价指标遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则，以评价对象和评价内容为基础，充分考虑评价指标和评价目标的关联度，采用能反映评价要求的核心指标，采取定量指标和定性指标相结合的方式系统反映项目实施所产生的产出指标和社会效益、可持续影响等，深入地分析项目本身的特点，兼顾了获取数据资料的具体情况和可操作性。本次评价指标体系不仅要满足本次绩效评价工作的需要，对于同类项目绩效评价也尽可能地提供借鉴和参考。

依据财政部、自治区针对预算绩效评价有关的规定统一制定的共性指标，以决策、过程、产出和效益四项为一级评

价指标，结合拉布大林农牧场有限公司粪污环境整治项目获取的文件、资料基础上进一步细化，构建绩效评价指标体系，绩效评价指标体系如下表：

表：2-1 拉布大林农牧场有限公司粪污环境整治项目指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标合理性
		绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金投入分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	项目制度健全性
		制度执行有效性
		项目管理规范性
		绩效管理规范性
	产出	产出数量
设备购置完成率		
委托咨询服务完成率		
产出质量		建设工程质量合格率
		购置设备质量合格率

一级指标	二级指标	三级指标
	产出时效	咨询服务质量合格率
		工程建设期限
		委托咨询服务期限
	产出成本	项目总成本控制率
效益	社会效益指标	提升污粪资源化利用水平
		提升当地居民生活质量
	生态效益指标	改善周边空气质量
	可持续影响指标	促进农牧业可持续发展
	满意度指标	社会群众满意度

3. 绩效评价依据

(1) 法规、政策依据

- 1) 《中华人民共和国预算法》;
- 2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);
- 3) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);
- 4) 内蒙古政府《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见》(内政办发〔2014〕70号);
- 5) 内蒙古财政厅《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监〔2019〕1343号);
- 6) 呼伦贝尔市人民政府办公室《呼伦贝尔市人民政府

办公厅关于加快推进预算绩效管理工作的通知》（呼政办发〔2016〕27号）；

7) 呼伦贝尔市财政局《呼伦贝尔市关于全面实施预算绩效管理的意见》（呼财监〔2021〕1221号）。

（2）评价工作资料

1) 按照本次绩效评价资料确认单上提供的基础资料；

2) 项目收入、支出及绩效实现情况进行的自查、自评资料；

3) 评价工作组通过现场核查、核实和问询等评价方式获得的资料。

4. 绩效评价方法

本次绩效评价方法采用定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，评价采用前期资料收集分析、听取汇报、查阅技术、财务资料、实地考察评价、询问、数据分类汇总、复核分析、与项目实施单位相关人员座谈、满意度调查等程序和具体方法进行绩效评价。

5. 绩效评价标准

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总体评价分值满分为100分，根据项目的总体评价分值，优（90分（含）—100分）、良（80分（含）—90分）、中（60分（含）—80分）、差（60分（不含）以下）。

(三) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作按照“公司统一组织、合理分工、明确责任；业务技术专家辅助”的原则进行。评价工作分为前期准备、组织实施、汇总评价、资料归档四个阶段。

1. 前期准备

(1) 成立组织机构。组建由财政财务、绩效管理、业务技术管理等方面的专家组成评价组，专家的产生主要由外聘技术专家组成。

(2) 制定评价计划。评价组通过对评价对象前期调研，制定绩效评价工作计划。

(3) 收集评价资料。评价组结合评价对象的具体情况，开展有针对性地培训工作，进行绩效评价详细分工，编制被评价单位所需的资料清单并进行收集。

(4) 制定绩效评价实施方案。根据项目的内容和特征，初步制定了评价指标体系、评价标准以及评价工作步骤和评价工作形象进度。期间多次沟通，征求修改意见，细化个性指标，最终确定实施方案，同时编制项目的满意度调查问卷。

2. 组织实施

(1) 下达评价入户通知。明确评价依据、任务、时间、人员等事项。相关领导及评价组人员听取了被评价单位的项目基本情况、资金管理、项目实施及项目取得的成果、成效等方面的汇报。

(2) 开展自评工作。根据评价组制定的评价实施方案、计划要求，准备相关资料，结合单位项目实际，填报自评表和撰写项目绩效自评报告。

(3) 查阅、收集基础数据与审核资料。评价工作组编制资料清单，结合评价对象实际情况完成了基础数据收集，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的数据资料进行核实确认。

(4) 现场调研和勘察。按照工作方案内容，评价工作组了解、勘察，收集相关业务、财务基础数据、问卷调查和访谈获取的数据，进行视图和文字记录，进一步优化绩效评价指标体系和工作实施方案。

3. 汇总评价

评价组按照绩效评价的原则、规范和方法，按照事先制定的绩效评价指标体系，在收集和审核数据及调查的基础上，对取得的资料进行加工整理，对采集的数据进行统计分析和研究判断，对取得的成就及存在的问题进行分析汇总，结合绩效评价组长带队通过现场调研及对接沟通获取的相关资料形成初步绩效评价结论。

根据初步评价结论，评价组专家经过会议讨论、进一步总结整理、研究、互查，探讨评价依据，深入分析存在问题，分析和完善评价结论，对项目进行量化分析，并对绩效评价指标评分表逐项进行打分、汇总评价专家意见。评价专家组

根据已定的评价结论开始分工撰写评价报告初稿，评价报告严格按照财政部、自治区对预算绩效评价有关的规定文件要求格式和内容进行编写，并积极沟通报告编写内容，力求报告能全面、客观、真实地反映拉布大林农牧场有限公司粪污环境整治项目的组织实施、取得成效、经验以及存在的问题，并提出合理化的参考建议，使本次评价结果得到充分利用。

4. 资料归档

项目完成后，按照绩效评价过程中收集到的相关材料以及其他可获得的文件资料等，统一进行资料归档。除基础资料归档以外，归档资料还包含：数据分析资料、专家指标评分、满意度调查和出具最终的绩效评价报告等。

三、综合评价情况及评价结论

通过对项目的前期调查、数据采集、资料收集分析、满意度调查及与被评价单位沟通讨论，并运用绩效评价指标体系进行定量考核、定性分析，认为本项目启动、决策依据充分，预算绩效管理工作有待加强，后续工程类项目需要完善农民工工资支付保障制度体系、完善进度计划管理、施工材料进场后及时组织检测，预期项目效益效果较好。经过评价专家组考评和综合评价，专家组认为：拉布大林农牧场有限公司粪污环境整治项目绩效评价报告最终绩效评价分值为82.79分，绩效评价等级为“良”。具体详见附件一《项目绩效评价指标体系及评价评分表》。

表：3-1 指标得分表

二级指标	权重	得分	得分率
项目决策	15	9.5	63.33%
项目过程	25	16.61	66.44%
项目产出	30	28	93.33%
项目效益	30	28.68	95.60%
合计	100	82.79	82.79%

四、绩效评价指标分析

本次绩效评价指标分析从项目决策、实施过程、产出、效益四个方面进行评价。通过评价组收集、查阅本项目档案资料、财务数据、文件、会议纪要等相关资料，结合走访调研项目实施现场，对项目资料进行核实和数据整理，并对相关数据逐一比对，与项目实施单位座谈沟通，对本项目服务对象开展满意度随访调查之后，本次评价将从决策与立项、目标指标设计、项目的管理与使用、组织实施、项目产出、效益效果等内容进行全面、客观分析。

（一）项目决策情况

本项目决策类指标从三个维度进行考察，分别是项目立项、绩效目标、资金投入。项目决策类指标总分为 15 分，实际得分 9.5 分，得分率 63.33%。各指标的实际得分情况见表 4-1。

表 4-1 项目决策类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	2	2	100%
	立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标	绩效目标合理性	3	1.5	50.00%
	绩效指标明确性	4	0	0%
资金投入	预算编制科学性	2	2	100%
	资金投入分配合理性	2	2	100%
决策指标得分合计		15	9.5	63.33%

1.项目立项情况分析

(1) 立项依据充分性

本项目符合相关政策、国民经济发展规划，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，立项依据充分，故本指标分值 2 分，得分 2 分。

(2) 立项程序规范性

该项目按照规定的程序申请设立，相关的审批文件、材料符合相关要求。此项分值 2 分，根据评分标准，本指标评价得 2 分。

2.项目绩效目标设定分析

(1) 绩效目标合理性

本项目未编制预算绩效目标，通过考察预算单位工作任

务。本工程旨在建设两座共 120 平方米的 MBR 膜污水处理一体化设备厂房，以及 2500 平方米的雨污分离棚，并安装相关玻璃钢罐和无害处理填埋井等设施。同时，购置并安装 MBR 膜污水处理设备、清粪车、清洗吸污车、生物质锅炉、生物质压块机及铲车等设备，以满足污水处理、废物处理及生产需求，全面提升环境保护和生产效率。本指标分值 3 分，得分 1.5 分。

(2) 绩效指标明确性

本项目未根据实施内容编制绩效目标，故本指标分值 4 分，得分 0 分。

3.资金投入分析

(1) 预算编制科学性

本项目资金预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。故本指标分值 2 分，得分 2 分。

(2) 资金投入分配合理性

通过预算单位提供的资料分析，本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。通过上述分析本指标分值 2 分，得分 2 分。

(二) 项目过程情况

本项目过程指标从两个维度进行考察，分别是资金管理和组织实施。项目过程类指标总分为 25 分，实际得分 16.61

分，得分率 66.44%。各指标的实际得分情况见表 4-2。

表 4-2 项目过程类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
资金管理	资金到位率	4	3.11	77.75%
	预算执行率	4	4	100%
	资金使用合规性	3	3	100%
组织实施	管理制度健全性	2	2	100%
	制度执行有效性	5	2	40.00%
	项目管理规范性	3	2.5	83.33%
	绩效管理规范性	4	0	0%
管理指标得分合计		25	16.61	66.44%

1.资金管理情况分析

(1) 资金到位率

财政资金到位率是指在某一时间段内，政府部门实际拨付的资金与预算安排的资金之间的比例。它反映了政府对公共项目的投入和保障能力，也是衡量财政资金使用效益和财政管理水平的重要指标。本项目申请财政资金 500 万元，实际到位资金 388.96 万元，资金到位率 = $388.96 \div 500 \times 100\% = 77.79\%$ 。故本指标分值 4 分，得分 3.11 分。

(2) 预算执行率

财政资金预算执行率是指实际支出数与预算分配数的比值，反映了财政资金的使用效益和预算管理的水平。通过

对数据的分析和对未来趋势的预测，可以制定更加科学合理的预算计划，优化财政支出结构，提高财政资金的使用效益。本项目实际到位资金 388.96 万元，执行预算资金为 388.96 万元，预算执行率= $388.96 \div 388.96 \times 100\%=100\%$ 。故本指标分值 4 分，得分 4 分。

(3) 资金使用合规性

通过分析预算单位提供的记账凭证，资金支付凭证，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故本指标分值 3 分，得分 3 分。

2. 项目组织实施情况分析

(1) 管理制度健全性

实施单位具有财务管理制度，财务管理制度制定的内容合法、合规、完整；业务管理制度方面具有《额尔古纳市拉布大林牧场粪污环境整治项目可行性研究报告》等。此项分值 2 分，根据评分标准，本指标评价得 2 分。

(2) 制度执行有效性

本项目未在开工后的 28 天内支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%，其余部分未按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。若预算单位不按时支付，发生安全事故时，预算单位会承担连带责任。

根据《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设工程竣工验收应当有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。《中华人民共和国建筑法》第五十九条规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。本项目在施工过程中未对主要建筑材料、建筑构配件等进行质量检测。

根据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第六条规定“总包单位应当在工程施工合同签订之日起 30 日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。专用账户名称为总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。”总包单位未按要求及时开立“农民工工资专用账户”。

建设单位未按施工进度计划支付安全文明施工费；施工过程中未对主要建筑材料、建筑构配件等进行质量检测；总包单位未按要求及时开立“农民工工资专用账户”；项目调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。此项分值 5 分，根据评分标准，本指标评价得 2 分。

(3) 项目管理规范性

根据提供的资料进行分析，资金拨付和支出进度与项目建设进度不匹配；预算单位按照政府采购制度、招投标制度

执行并规范；项目具有档案资料（如项目台账、合同、审批、监理日志、验收报告相关文件资料等）齐全，并有专人管理。此项分值 3 分，根据评分标准，本指标评价得 2.5 分。

（4）绩效管理规范性

《呼伦贝尔市关于全面实施预算绩效管理的意见》要求各级各部门对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。各部门各单位要严格按照绩效自评要求，对照年初设定的绩效目标，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，并于规定时限参照标准化模板撰写自评报告报送本级财政部门，着重提升绩效自评质量。

预算单位未按要求开展预算绩效自评和监控工作。故本指标分值 4 分，得分 0 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本四个方面对项目产出进行考察，项目绩效总分 30 分，得分为 28 分，得分率为 93.33%，指标得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3 项目产出类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
产出数量	建设工程完成率	4	4	100%
	设备购置完成率	4	4	100%

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
	委托咨询服务完成率	4	4	100%
产出质量	建设工程质量合格率	3	3	100%
	购置设备质量合格率	3	3	100%
	咨询服务质量合格率	3	3	100%
产出时效	工程建设期限	3	1	33.33%
	委托咨询服务期限	3	3	100%
产出成本	项目总成本控制率	3	3	100%
产出指标得分合计		30	28	93.33%

1. 产出数量情况分析

(1) 建设工程完成率

计划新建 MBR 膜污水处理一体化设备厂房 2 座共 120 平方米；新建雨污分离棚 2500 平方米，挤奶厅玻璃钢罐 2 个，尿液池玻璃钢罐 3 个，无害处理填埋井 5 个。按照上述要求完成工程量，故本指标分值 4 分，得分 4 分。

(2) 设备购置完成率

计划购置安装 MBR 膜污水处理一体化设备 2 套，清粪车 3 台，清洗吸污车 2 台，生物质锅炉 5 台，生物质压块机 1 台，铲车 2 台。按照上述要求完成购置数量，故本指标分值 4 分，得分 4 分。

(3) 委托咨询服务完成率

本项目计划委托咨询服务有粪污环评服务、工程监理咨

询服务、设计咨询服务、可行性研究咨询服务。按照上述要求完成工作量，故本指标分值 4 分，得分 4 分。

2. 产出质量情况分析

(1) 建设工程质量合格率

工程内容建设已完成，工程质量合格，管护主体、管理责任基本落实，发挥生态效益，达到成果。故本指标分值 3 分，得分 3 分。

(2) 购置设备质量合格率

在本次采购与安装项目中，所有设备运行稳定、各项性能指标达标，设备质量验收合格。故本指标分值 3 分，得分 3 分。

(3) 咨询服务质量合格率

各项咨询报告内容详实、数据准确，严格遵循行业规范与项目要求，各项服务成果均符合预定标准，咨询服务质量达标。故本指标分值 3 分，得分 3 分。

3. 产出时效情况分析

(1) 工程建设期限

本工程合同规定工期为 2021 年 11 月 1 日—2021 年 12 月 30 日，工期总日历天数为 60 天。实际工期为 2021 年 10 月 29 日—2022 年 8 月 15 日，工期总日历天数为 290 天。故本指标分值 3 分，得分 1 分。

(2) 委托咨询服务期限

服务全程严格按照合同约定期限推进，各阶段成果均按时交付，受托方在规定的服务周期内完成，有效保障了项目咨询工作的连贯性。故本指标分值 3 分，得分 3 分。

4. 产出成本情况分析

(1) 项目总成本控制率

预算单位申请财政资金 388.96 万元，本项目共支出 388.96 万元，项目总成本控制有效，具体支出如下表所示。故本指标分值 3 分，得分 3 分。

表 4-3-1 费用支出明细表

单位：万元

项目	预算金额	已付金额
粪污处理工程款	433.34	330.63
环评咨询服务费	29.80	29.80
工程监理服务费	6.88	6.88
可行性研究咨询服务费	3.90	3.90
设计咨询服务费	17.75	17.75
合计	491.67	388.96

(四) 项目效益情况

项目绩效指标从社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标四个方面对项目效益进行考察，项目绩效总分 30 分，得分为 28.68 分，得分率为 95.60%，指标

得分情况如表 4-4 所示。

表 4-4 项目绩效类指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
社会效益	提升污粪资源化利用水平	5	4.84	96.80%
	提升当地居民生活质量	5	4.84	96.80%
生态效益	改善周边空气质量	5	4.79	95.80%
可持续影响	促进农牧业可持续发展	5	4.84	96.80%
满意度指标	社会群众满意度	10	9.37	93.70%
效果指标得分合计		30.00	28.68	95.60%

1. 项目社会效益分析

(1) 提升污粪资源化利用水平

本效益指标根据满意度调查问卷进行评分，在对“您认为项目对污粪资源化利用水平的提升效果如何？”问题进行调查中 84.21%的人认为非常显著，15.79%的人认为比较显著，0%的人认为一般。根据评分标准，（认为非常显著的赋系数 $1 \times$ 满意度百分比+认为比较显著的赋系数 $0.8 \times$ 满意度百分比+认为一般的赋系数 $0.6 \times$ 满意度百分比+认为不太显著的赋系数 $0 \times$ 满意度百分比）= $\{ (1 \times 84.21\%) + (0.80 \times 15.79\%) + (0.60 \times 0\%) + (0 \times 0\%) \} \times 5=4.84$ ，故本指标分值 5 分，得分 4.84 分。

(2) 提升当地居民生活质量

本效益指标根据满意度调查问卷进行评分，在对“您认为项目对当地居民生活质量的提升效果如何？”问题进行调查中 84.21%的人认为非常显著，15.79%的人认为比较显著，0%的人认为一般。根据评分标准，（认为非常显著的赋系数 $1 \times$ 满意度百分比+认为比较显著的赋系数 $0.8 \times$ 满意度百分比+认为一般的赋系数 $0.6 \times$ 满意度百分比+认为不太显著的赋系数 $0 \times$ 满意度百分比）= $\{(1 \times 84.21\%)+(0.80 \times 15.79\%)+(0.60 \times 0\%)+(0 \times 0\%)\} \times 5=4.84$ ，故本指标分值 5 分，得分 4.84 分。

2. 项目生态效益分析

(1) 改善周边空气质量

本效益指标根据满意度调查问卷进行评分，在对“您认为项目对周边空气质量的改善效果如何？”问题进行调查中 78.95%的人认为非常显著，21.05%的人认为比较显著，0%的人认为一般。根据评分标准，（认为非常显著的赋系数 $1 \times$ 满意度百分比+认为比较显著的赋系数 $0.8 \times$ 满意度百分比+认为一般的赋系数 $0.6 \times$ 满意度百分比+认为不太显著的赋系数 $0 \times$ 满意度百分比）= $\{(1 \times 78.95\%)+(0.80 \times 21.05\%)+(0.60 \times 0\%)+(0 \times 0\%)\} \times 5=4.79$ ，故本指标分值 5 分，得分 4.79 分。

3. 项目可持续影响分析

(1) 促进农牧业可持续发展

本效益指标根据满意度调查问卷进行评分，在对“您认为项目对促进农牧业可持续发展效果如何？”问题进行调查中 84.21%的人认为非常显著，15.79%的人认为比较显著，0%的人认为一般。根据评分标准，（认为非常显著的赋系数 $1 \times$ 满意度百分比+认为比较显著的赋系数 $0.8 \times$ 满意度百分比+认为一般的赋系数 $0.6 \times$ 满意度百分比+认为不太显著的赋系数 $0 \times$ 满意度百分比）= $\{ (1 \times 84.21\%) + (0.80 \times 15.79\%) + (0.60 \times 0\%) + (0 \times 0\%) \} \times 5 = 4.84$ ，故本指标分值 5 分，得分 4.84 分。

4. 项目满意度分析

(1) 社会群众满意度

本指标根据满意度调查问卷进行评分，在对“您对本项目实施后的总体评价如何？”问题进行调查中 68.42%的人认为非常满意，31.58%的人认为满意，0%的人认为一般。根据评分标准，（认为非常满意的赋系数 $1 \times$ 满意度百分比+认为满意的赋系数 $0.8 \times$ 满意度百分比+认为一般的赋系数 $0.6 \times$ 满意度百分比+认为不太满意的赋系数 $0 \times$ 满意度百分比）= $\{ (1 \times 68.42\%) + (0.80 \times 31.58\%) + (0.60 \times 0\%) + (0 \times 0\%) \} \times 10 = 9.37$ ，故本指标分值 10 分，得分 9.37 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）农民工权益保障不到位

根据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第六条规定“总包单位应当在工程施工合同签订之日起 30 日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。专用账户名称为总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户。”总包单位未按要求及时开立“农民工工资专用账户”。

（二）未按要求预付安全文明施工费

本项目未在开工后的 28 天内支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%，其余部分未按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。

（三）施工过程中未进行建材质量检测

根据《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设工程竣工验收应当有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。《中华人民共和国建筑法》第五十九条规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同的约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。本项目在施工过程中未对主要建筑材料、建筑构配件等进行质量检测。

（四）项目实施进度推进缓慢

本工程合同规定工期为 2021 年 11 月 1 日—2021 年 12

月 30 日，工期总日历天数为 60 天。实际工期为 2021 年 10 月 29 日—2022 年 8 月 15 日，工期总日历天数为 290 天。与计划相比工程延期 230 天。

六、有关建议

(一) 完善农民工工资支付保障制度体系

建议预算单位依据国家及地方政策法规，在合同里清晰界定农民工工资专户设立事宜，并督促各方切实执行，压实主体责任。总承包单位应在工程所在地金融机构开设专用于支付农民工工资的存款账户。建设单位需依照合同约定的周期和比例，按时、足额将工资专项工程款拨付至总包单位专用账户。人工费用务必从工程款中剥离，单独管理，确保专款专用，避免与其他费用混同或被挤占，杜绝工程款与农民工工资拖欠问题相互交织。

(二) 完善进度计划管理

在项目初期，制定详细、合理的进度计划。进度计划应包括总进度计划、月进度计划、周进度计划甚至日进度计划，并且要明确各工序的先后顺序、持续时间、资源分配等情况。例如，总进度计划要涵盖主体施工、设备安装等主要项目的开始时间、完成时间，月进度计划和周进度计划则要进一步细化各子项目的具体工作内容和时间安排。建立每日或每周的施工进度会议制度，建设单位、施工单位、监理单位等相

关方参与会议。在会议上，各方通报工作进展情况，讨论遇到的问题 and 解决方案。

（三）施工材料进场后及时组织检测

在后续建设工程项目中，施工材料进场前，施工单位应向监理单位提交材料报验单，并附上进场材料的合格证明和质量保证书等相关资料。监理单位对提交的资料进行审核，确认材料符合要求后，同意材料进场。材料进场后，施工单位应按照国家或行业标准进行取样，并送交具有相应资质的检测机构进行检测。检测机构对送检的样品进行检测，并出具检测报告。如果材料合格，则施工单位将材料用于工程施工；如果材料不合格，则施工单位需要按照相关规定进行处理，如退货、换货等。

七、其他需要说明的问题

（一）关于评价责任的说明

被评价单位的责任是提供与形成本次绩效评价报告相关的基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。本项目评价的可靠性基于单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在单位提供的现有资料的前提下，结合职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

（二）提示报告使用者注意事项的说明

我公司及评价人员与委托单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

八、附件

附件一 项目绩效评价指标体系及评价评分表

附件二 专家及评价工作组情况表

附件三 专家意见汇总表

附件四 内蒙古数财管理咨询有限公司营业执照复印件

附件五 满意度调查问卷及统计表

评价机构：内蒙古数财管理咨询有限公司

附件一 项目绩效评价指标体系及评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(分值0-0.5分); ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(分值0-0.5分); ③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(分值0-0.5分); ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(分值0-0.5分)。	2	2	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立(分值0-1分); ②审批文件、材料是否符合相关要求(分值0-1分);	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标(分值0-1分); ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(分值0-1分); ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(分值0-0.5分); ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(分值0-0.5分); (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目	3	1.5	无绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分原因
				标)。			
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(分值0-2分); ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(分值0-1分); ③是否与项目目标任务数或计划数相对应(分值0-1分)。	4	0	无绩效目标申报表
	资金投入	预算编制科学性	预算内容与项目内容是否匹配;预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	评价要点: ①资金预算内容与项目内容是否匹配(分值0-1分); ②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(分值0-0.5分); ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(分值0-0.5分)。	2	2	
		资金投入分配合理性	项目预算资金支出方向是否明确;资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	评价要点: ①项目预算资金支出方向是否明确(分值0-1分); ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(分值0-1分)。	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点: 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%,满分3分。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。	4	3.11	财政资金到位率 77.79%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分原因
				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。			
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（预算单位实际支出资金/实际到位资金）×100%，满分5分。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	4	
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0-0.5分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0-0.5分）； ③是否符合项目预算批复规定的用途（0-0.5分）； ④是否做好完成资金预决算和审计报告（0-1分）； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分，发现问题，本指标不得分。	3	3	
	组织实施	项目制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①项目实施单位具有健全的财务和业务管理制度（0-1分）； ②项目实施单位财务和业务管理制度合法、合规、完整得（0-1分）。	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分原因
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(0-3分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(0-1分); ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(0-1分)。	5	2	安全文明施工费未及时支付;未按要求及时开立“农民工工资专用账户”;未对主要建筑材料进行检测
		项目管理规范性	用以反映预算单位在项目管理过程中的规范性。	①资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况(0-1分); ②政府采购制度、招投标制度执行是否规范(0-1分); ③项目应有的档案资料(如项目台账、合同、审批、监理日志、验收报告相关文件资料等)是否齐全,并有专人管理(分值0-1分)。	3	2.5	资金拨付和支出进度与项目建设进度不匹配
		绩效管理规范性	本指标考核是否按照财政部门要求对项目开展预算绩效自评和监控。	评价要点: ①预算单位是否按要求进行全过程绩效管理,评分按实施程度得分(0-4分)	4	0	未开展预算绩效自评和监控工作
产出	产出数量	建设工程完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点: 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分原因
		设备购置完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点: 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	4	
		委托咨询服务完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点: 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	4	
	产出质量	建设工程质量合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点: 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	3	3	
		购置设备质量合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点: 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分原因
				值。			
		咨询服务质量合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点: 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	3	3	
	产出时效	工程建设期限	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点: 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	1	与计划相比工程延期 230 天
		委托咨询服务期限	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点: 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	3	3	
	产出成本	项目总成本控制率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点: 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算	3	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分	扣分原因
				为参考，有效节约或持平得满分，超支不得分			
效益	社会效益指标	提升污水资源化利用水平	衡量社会效益情况。	评价要点：根据满意度调查结果进行综合评分。	5	4.84	根据满意度得分
		提升当地居民生活质量	衡量社会效益情况。	评价要点：根据满意度调查结果进行综合评分。	5	4.84	根据满意度得分
	生态效益指标	改善周边空气质量	衡量生态效益情况。	评价要点：根据满意度调查结果进行综合评分。	5	4.79	根据满意度得分
	可持续影响指标	促进农牧业可持续发展	衡量可持续影响情况	评价要点：根据满意度调查结果进行综合评分。	5	4.84	根据满意度得分
	满意度指标	社会群众满意度	社会群众对项目实施效果的满意程度。	评价要点：根据满意度调查结果进行综合评分。	10	9.37	根据满意度得分
得分					100	82.79	

附件二 专家及评价工作组情况表


姓名	职责分工	专业领域	职称	备注
刘宇东	项目负责人，负责项目的总体规划、对接联络、质量审核、实地评价组织、项目实际产出效果分析、项目小结报告及项目总报告撰写等工作。	绩效专家	高级会计师	
朱慧敏	财务管理专家，负责项目财务资料审核。	财务管理	高级会计师	
王佳鑫	行业专家，负责项目管理、绩效分析等。	公共管理、绩效管理	注册会计师	
闫慧生	负责项目总体安排、资料整理、现场评价组织、效益情况分析。	会计学	项目经理	
张松	负责项目资料整理、现场评价协助、效益情况分析、单位沟通、数据统计等工作。	法学	项目助理	

附件2-1专家职称

专家：刘宇东



注册会计师证书



法律职业资格证书



计算机信息系统项目高级管理师证书




一级注册消防工程师资格证书



专家：朱慧敏



专家：王佳鑫


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

	姓名	王佳鑫
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1979-12-03
	Date of birth	
工作单位	呼和浩特市东瑞联合会计师事务所	
Working unit		
身份证号码	1 [REDACTED]	
Identity card No.		

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <div style="text-align: center;"> 王佳鑫2019年度年检通过</div> <p style="text-align: center;">年 月 日 /y /m /d</p> <p style="text-align: left;">6</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <div style="text-align: center;"> 王佳鑫2020年度年检通过</div> <p style="text-align: center;">年 月 日 /y /m /d</p> <p style="text-align: right;">7</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、住房和城乡建设部批准
颁发，表明持证人通过国家统一组织的
考试，取得一级造价工程师职业资格。



姓 名: 王佳鑫
证件号码: [REDACTED]
性 别: 男
出生年月: 1979 年 12 月
专 业: 土木建筑工程
批准日期: 2020 年 10 月 25 日
管 理 号: 20201004515000000512



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



附件三 专家意见汇总书

项目单位：拉布大林农牧场有限公司粪污环境整治

一、专家评分汇总表

评价指标及分值		专家评价计分				
评价指标	分值	刘宇东	朱慧敏	王佳鑫	平均分	
决策	项目立项	4	4	4	4	4
	绩效目标	7	1.5	1.5	1.5	1.5
	资金投入	4	4	4	4	4
过程	资金管理	11	10.11	10.11	10.11	10.11
	组织实施	14	6.5	6.5	6.5	6.5
产出	产出数量	12	12	12	12	12
	产出质量	9	9	9	9	9
	产出时效	6	4	4	4	4
	产出成本	3	3	3	3	3
效益	社会效益	10	9.68	9.68	9.68	9.68
	生态效益	5	4.79	4.79	4.79	4.79
	可持续影响	5	4.84	4.84	4.84	4.84
	满意度	10	9.37	9.37	9.37	9.37
合计		100	82.79	82.79	82.79	82.79

二、专家评价综合意见

评价得分	82.79
绩效级别	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
问题：	
1、农民工权益保障不到位	
2、未按要求预付安全文明施工费	
3、施工过程中未进行建材质量检测	
4、项目实施进度推进缓慢	
建议：	
1、完善农民工工资支付保障制度体系	
2、完善进度计划管理	
3、施工材料进场后及时组织检测	
专家签字：	
内蒙古数财管理咨询有限公司（盖章）	
2024年12月	

附件四 内蒙古数财管理咨询有限公司营业执照复印件

统一社会信用代码 91150102MA13U98N94

营业执照 (副本) (1-1)

扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统
获取更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 内蒙古数财管理咨询有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 闫慧生

注册资本 壹佰万元(人民币元)

成立日期 2021年03月03日

经营范围 一般项目：财政投资项目预算绩效评价服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理服务；企业管理咨询；商务代理代办服务；财务咨询；税务服务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；招投标代理服务；安全咨询服务；消防技术服务；安全系统监控服务；紧急救助服务；环境应急治理服务；工程管理服务；消防安全监测和报警；消防设施维护服务；工程管理服务；消防技术服务；消防技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街东方银座大厦3楼304室

2023年08月15日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
http://www.gsxt.gov.cn


国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:

附件五 满意度调查问卷统计表


额尔古纳市拉布大林牧场粪污环境整治项目社会群众满意度调查问卷

Q1.您在拉布大林牧场及周边地区的居住时间:

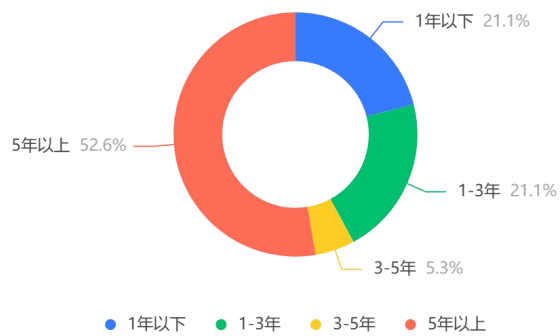


选项	选择次数	百分比
1 年以下	4	21.05%
1-3 年	4	21.05%
3-5 年	1	5.26%
5 年以上	10	52.63%
回答人数 19		

Q2.您认为该项目对当地环境改善的整体印象如何?

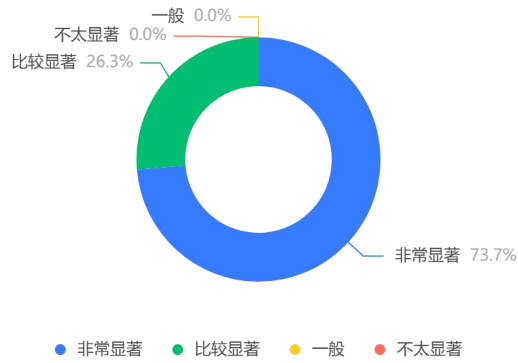


选项	选择次数	百分比
非常显著	14	73.68%
比较显著	5	26.32%
一般	0	0.00%
不太显著	0	0.00%
回答人数 19		

Q3.您对项目中粪污处理设施的建设和运行满意度如何?

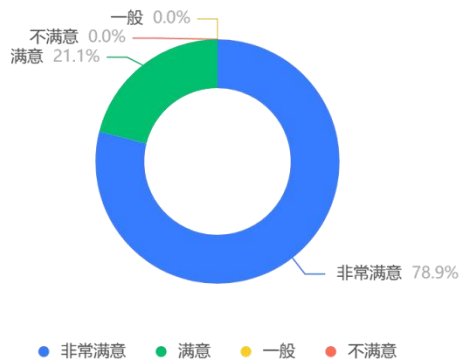


选项	选择次数	百分比
非常满意	15	78.95%
满意	4	21.05%
一般	0	0.00%
不满意	0	0.00%
回答人数 19		

Q4.您认为项目对周边空气质量的改善效果如何?

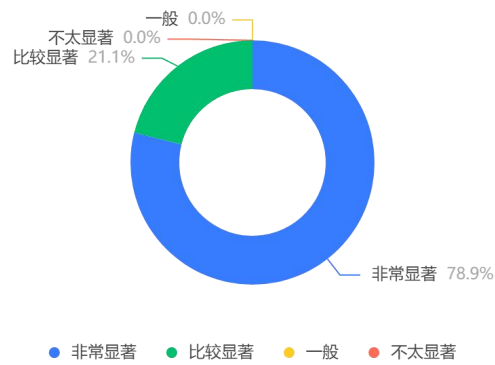

选项	选择次数	百分比
非常显著	15	78.95%
比较显著	4	21.05%
一般	0	0.00%
不太显著	0	0.00%
回答人数 19		


Q5.您认为项目对周边土壤环境的改善效果如何?

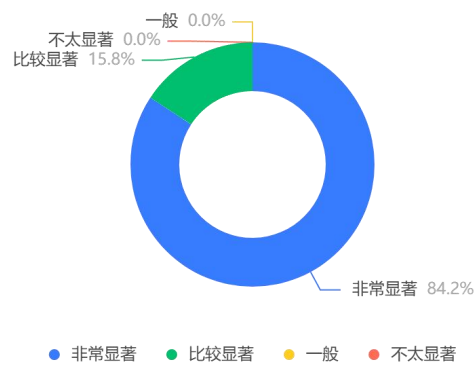

选项	选择次数	百分比
非常显著	16	84.21%
比较显著	3	15.79%
一般	0	0.00%
不太显著	0	0.00%


回答人数 19

Q6.您认为项目对当地居民生活质量的提升效果如何?

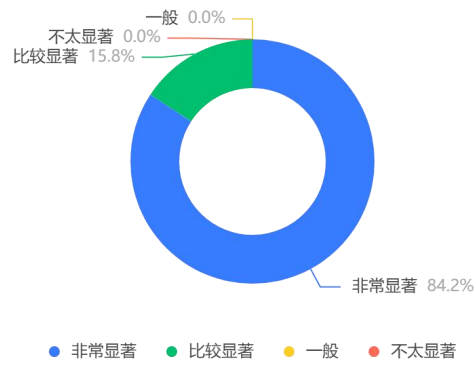

选项	选择次数	百分比
非常显著	16	84.21%
比较显著	3	15.79%
一般	0	0.00%
不太显著	0	0.00%
回答人数 19		


Q7.您认为项目对污粪资源化利用水平的提升效果如何?

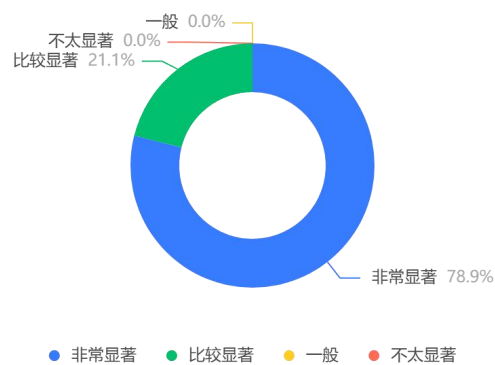

选项	选择次数	百分比
非常显著	15	78.95%
比较显著	4	21.05%
一般	0	0.00%


不太显著	0	0.00%
回答人数 19		

Q8.您认为项目对促进农牧业可持续发展效果如何?

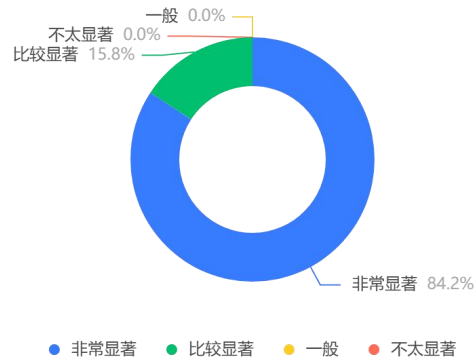

选项	选择次数	百分比
非常显著	16	84.21%
比较显著	3	15.79%
一般	0	0.00%
不太显著	0	0.00%
回答人数 19		

Q9.您对本项目实施后的总体评价如何?

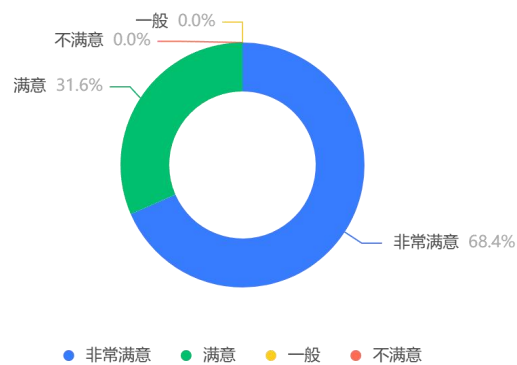

选项	选择次数	百分比
非常满意	13	68.42%
满意	6	31.58%

一般	0	0.00%
不满意	0	0.00%
回答人数 19		

Q10.您认为该项目在哪些方面还需要进一步改进?

序号	回答详情
18	无
17	无
15	非常满意，无需改进
14	无
12	无
9	无
6	多建设这样有意义的工程项目
3	加强该项目后续维护以及监管
回答人数 8	
